

第 5 編 關 連 資 料

第1章 関連機関への提出書類

1. 許認可等の概要

沖縄県海水淡水化施設の建設に当り、平成5年10月の着工前後から平成8年2月のQ=10,000 m³/日供用開始まで各工事に必要となる許可書や届出書類は、延べ41件に及んでいる。

表5-1-1、表5-1-2に示すとおり、土木・建築工事の構造物に関する占用申請や計画通知が14件、機械・電気工事の設備に関する届出・申請が26件と多くなっており、設備規模の大きさがうかがえる。

表5-1-1 海水淡水化施設建設工事に必要な許認可等一覧表

工 事	件 数	関係法令	所管官庁
土木工事	4件	海岸法 水産資源保護法 道路法等	沖縄県 北谷町 北谷町等
建築工事	10件	建築基準法 消防法 労働安全衛生法 騒音規制法等	沖縄県 北谷町 労働基準監督署 北谷町等
電気工事	15件	電気事業法 電気事業法 消防法	沖縄総合事務局 沖縄電力 北谷町
機械工事	11件	労働安全衛生法 騒音規制法	労働基準監督署 北谷町
その他	1件	水道法	厚生省
計	41件		

表5-1-2 許認可等の種類

許認可等	件 数
許可申請書	11件
届出書	22件
通知書	3件
願い書	2件
契約書	1件
報告書	2件
計	41件

沖縄県海水淡水化施設建設工事に係る許認可等一覧表

平成6年8月31日 工務課作成

1. 土木工事

1) 取水・放流管布設工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①海岸保全区域占用許可申請書	県河川課 (県知事)	海岸法第7条(海岸保全区域の占用) 海岸法施行規則第3条 (海岸保全区域の占用の許可) 沖縄県海岸管理規則第3条 (占用の許可申請)	中部土木事務所を経由して申請 占用面積 395 m ² 6,949 m ² (工事期間中)
②海岸保全区域における土地の掘削等の許可申請書	県河川課 (県知事)	沖縄県海岸管理規則第5条 (制限行為等の許可申請)	掘削面積 6,949 m ² 添付書類 ・利害関係者の同意書(北谷漁協) ・地元市町村の意見書(北谷町) ・環境影響調査書
③岩礁破碎等許可申請書	県漁政課 (県知事)	水産資源保護法第4条 (水産動植物の採捕制限等に関する命令) 沖縄県漁業調整規則第38条 (漁場内の岩礁破碎等の許可)	岩礁破碎面積 6,949 m ² 添付書類 ・岩礁破碎等に対する漁業権者の同意書(北谷漁協) ・岩礁破碎等に対する漁業権者の総会議事録(北谷漁協) ・関係市町村長の意見書(北谷町) ・漁業権者との漁業汚染防止協定書(北谷漁協)
④道路占用許可申請書	北谷町建設課 (町長)	道路法第32条(道路の占用の許可)	占用面積 18.78 m ²

2. 建築工事

1) 土木建築工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①建築工事届	中部土木事務所 (県知事)	建築基準法第15条(届出及び統計)	北谷町都市計画課を経由して届出
②計画通知書 [建築物]	中部土木事務所 (建築主事)	建築基準法第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は更正措置に関する手続きの特例)	北谷町都市計画課を経由して届出
③工事完了通知	〃	〃	北谷町都市計画課を経由して届出 提出時期[工事完了後4日]
④計画建築物等の届出書	北谷町都市計画課 (町長)	北谷町電波障害防止建築指導要綱第5条 (計画建築物等の届出)	添付書類 ・同要綱に規定する同意書及び誓約書
⑤特例規定適用願	北谷町消防本部 (消防長)	消防法施行令第32条(基準の特例)	・水噴霧消化設備 ・自動火災報知設備 ・消防用水
⑥排水設備使用開始届	北谷町下水道課 (町長)	北谷町下水道条令第6条第1項 (排水設備工事の申込)	

2) 搬送設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①計画通知書 (昇降機)	中部土木事務所 (建築主事)	建築基準法第 87 条の 2 (建築設備への準用) 建築基準法第 88 条 (工作物への準用)	北谷町都市計画課を經由して通知
②完了届	〃	〃	北谷町都市計画課を經由して届出 提出時期 [工事完了後 4 日]

3) 建築付帯電気設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①消防用設備等着工 届	北谷町消防本部 (消防長)	消防法第 17 条の 14 (工事着工の届出)	自動火災報知設備等の消防用設備 提出時期 [工事開始 10 日前]
②消防用設備等設置 届	北谷町消防本部 (消防長)	消防法第 17 条の 3 の 2 (消防用設置等の検査)	自動火災報知設備等の消防用設備 提出時期 [工事完了後 4 日]

3. 電気工事

1) 特高受変電設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①工事計画認可申請	沖縄総合事務局 通商産業部 公益事業課 (総合事務局長)	電気事業法第 70 条 (工事計画)	受電電圧 [1 万 V 以上] 提出時期 [工事開始 30 日前]
②主任技術者選任届	〃	電気事業法第 72 条 (主任技術者)	届出済
③保安規定届	〃	電気事業法第 52 条 (保安規定)	届出済
④使用前検査申請	〃	電気事業法第 43 条 (使用前検査)	
⑤受電届	〃	電気事業法第 27 条 (電気の使用制限等) 受電調整規則第 1 条 (受電調整規則)	受電電力容量 [5, 000kW 以上] 提出時期 [受電開始 30 日前]
⑥受給契約の申込み	沖縄電力(株)	電気事業法第 19 条 (供給規程) 沖縄電力(株) 電気供給規程	
⑦電気受給契約	〃	〃	時間帯別調整契約
⑧受電設備設置届	北谷町消防本部 (消防長)	消防法第 9 条 (火を使用する設備、器具等に対する規制) 北谷町火災予防条例第 11 条 (変電設備)	変電設備 [20kW 以上] 提出時期 [工事開始 30 日前]

2) 自家発電設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①工事計画届	沖縄総合事務局 通商産業部 公益事業課 (総合事務局長)	電気事業法第 71 条 (工事計画)	出力 [100kW 以上] 提出時期 [工事開始 30 日前]
②使用前検査申請	〃	電気事業法第 43 条 (使用前検査)	
③発電設備設置届	北谷町消防本部 (消防長)	消防法第 9 条 (火を使用する設備、器具等に対する規制) 北谷町火災予防条例第 12 条 (発電設備)	自家発電設備 提出時期 [工事開始 3 日前]
④蓄電池設備設置届	〃	消防法第 9 条 (火を使用する設備、器具等に対する規制) 北谷町火災予防条例第 13 条 (蓄電池設備)	容量 [4, 800Ah 以上] 提出時期 [工事開始 3 日前]
⑤危険物貯蔵所設置 許可申請	〃	消防法第 11 条 (製造所等の設置の許可及び完成検査)	第四類第三石油類 (重油) 燃料タンク [2, 000t 以上] 容量 6, 000 t
⑥完成検査申請	〃	〃	〃

3) 中央監視制御設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①蓄電池設備設置届	北谷町消防本部 (消防長)	消防法第9条 (火を使用する設備、器具等に対する規制) 北谷町火災予防条例第13条(蓄電池設備)	容量〔4,800Ah以上〕 提出時期〔工事開始3日前〕

4. 機械工事

1) 原水設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①クレーン設置報告書	沖縄労働基準 監督署(署長)	労働安全衛生法第88条(計画の届出等) 労働安全衛生法施行令第13条(労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等) クレーン等安全規則第11条(設置報告書)	天井走行クレーン〔0.5~3 ton〕 沈砂池、ポンプ室 吊り荷重 2.0ton 提出時期〔工事開始30日前〕

2) 調整設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①クレーン設置届	沖縄労働基準 監督署(署長)	労働安全衛生法第88条(計画の届出等) クレーン等安全規則第5条(設置届)	天井走行クレーン〔3 ton以上〕 ろ過機室 吊り荷重 35ton 提出時期〔工事開始30日前〕
②クレーン落成検査申請書	〃	労働安全衛生法第38条(製造時等検査等) クレーン等安全規則第6条(落成検査)	〃
③特定施設設置届出書	北谷町都市計画課 (町長)	騒音規制法第6条(特定施設の設置の届出) 騒音規制法施行令第1条(特定施設) 騒音規制法施行令第4条(事務の委任)	空気圧縮機〔7.5kW以上〕 出力 30kW 提出時期〔工事開始30日前〕

3) 逆浸透設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①クレーン設置報告書	沖縄労働基準 監督署(署長)	労働安全衛生法第88条(計画の届出等) 労働安全衛生法施行令第13条(労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)	ホイスト、天井走行クレーン 〔0.5~3 ton〕 保安フィルター室、RO供給ポンプ室、RO室 吊り荷重 2.0、2.0、2.8ton 提出時期〔工事開始30日前〕
②クレーン設置届	〃	労働安全衛生法第88条(計画の届出等) クレーン等安全規則第5条(設置届)	天井走行クレーン〔3 ton以上〕 高圧ポンプ室 吊り荷重 7.5ton 提出時期〔工事開始30日前〕
③クレーン落成検査申請書	〃	労働安全衛生法第88条(計画の届出等) クレーン等安全規則第6条(落成検査)	〃
④少量危険物貯蔵取扱い届出書	北谷町消防本部 (消防長)	消防法第9条の3(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの基準) 北谷町火災予防条例第46条(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)	高圧ポンプ設備軸受油滑エット薬注設備(硫酸)
⑤特定施設設置届出書	北谷町都市計画課 (町長)	騒音規制法第6条(特定施設の設置の届出) 騒音規制法施行令第1条(特定施設) 騒音規制法施行令第4条(事務の委任)	空気圧縮機〔7.5kW以上〕 出力 30kW 提出時期〔工事開始30日前〕
⑥特定化学設備等設置届	沖縄労働基準 監督署(署長)	労働安全衛生法第88条(計画の届出等) 特定化学物質等障害予防規則第52条(届出及び報告) 特定化学物質等障害予防規則第2条第1項(定義等)	

4) 脱水設備工事

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①産業廃棄物処理施設設置届	県生活衛生課 (県知事)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項(産業廃棄物処理施設)	汚泥脱水処理施設 提出時期〔工事開始30日前〕

5. その他

1) 海淡水施設の供用開始

許認可名	所轄官庁	関係法令	備考
①給水開始届	厚生省 (厚生大臣)	水道法第13条(給水開始前の届出及び検査) 水道法施行規則第10条 (給水開始前の水質検査) 水道法施行規則第11条 (給水開始前の施設検査)	県環境保健部生活衛生課を経由して届出 (準用規程) 水道法第31条 水道法施行規則第20条

第2章 新聞記事及び文献

1. 新聞記事

海水淡水化施設は、昭和 52 年に厚生省が「沖縄本島海水淡水化計画調査」を実施して以来、供用開始まで 20 年近くの歳月を費やしたことになる。これまでに、厚生省、沖縄開発庁並びに通産省をはじめ、造水促進センター、日本水道協会等の関係団体の発表文献やマスコミが新聞雑誌等に掲載した記事は、整理すると膨大な資料となる。

そこで、本章では、予備調査から供用開始に至るまでの各年度における主なトピックスを新聞記事（切抜き）で紹介する。

表 5-2-1 沖縄県海水淡水化施設関連新聞記事

年 月 日	見 出 し	社 名
平成 3. 12. 19	水道問題研究会“海水淡水化”で勉強会	日本水道新聞
4. 4. 3	海水淡水化を推進	沖縄タイムス
5. 2. 21	他目的ダムに 13 億円余	琉球新報
5. 3. 14	海水淡水化施設、10 月に着工	琉球新報
5. 10. 1	今月中にも着工	琉球新報
5. 10. 1	海水から真水を	沖縄タイムス
5. 10. 2	世界に誇れる「淡水化施設」を	沖縄タイムス
5. 11. 8	海水淡水化施設に着工	日本水道新聞
5. 11. 18	沖縄県の「水問題」解決へ大きな期待!!	沖縄タイムス
5. 11. 18	周りの海を水源に	沖縄タイムス
5. 11. 18	海水淡水化施設工事に着工 4 万立方メートル供給	琉球新報
5. 11. 24	国内最大、沖縄で着工	日経産業新聞
5. 11. 24	海水淡水化施設を起工	沖縄建設新聞
5. 11. 28	四全総後も沖縄振興に全力	沖縄タイムス
6. 8. 16	海水の淡水化本格導入へ	朝日新聞
6. 8. 18	海水淡水化施設を推進	琉球新報
6. 10. 1	海淡施設工事が本格化	トピックス沖縄
8. 1. 29	供用開始に寄せて 今後の範となる施設 的確な導入を高く評価	日本水道新聞
8. 1. 29	全面供用へ事業推進	日本水道新聞
8. 2. 1	規模、技術ともに世界屈指の施設	水道産業新聞

水道問題
研究会

海水淡水化で勉強会


高度浄水や漏水防止も

ふれっしゅ水道計画も説明


水道を改善し、諸問題に強い関心を有する国会議員で構成する「水道問題研究会」(座長・橋本龍太郎衆議院議員)は十六日、東京・千代田区永田町のキャピトル東急で午前八時半から第六回会合を開催。厚生省(玉木生活衛生局長、小林水道環境部長)から「ふれっしゅ水道計画」及び「平成四年度水道関係予算要求概要」について話を聞く。

ともに、事業化を予定している沖縄県(石川企業局長)から「水道水源としての海水淡水化」について説明を聞いた。研究会は橋本座長が進行役を兼ねて展開されたが、出席メンバーからは海水淡水化について「まらす、高度浄水処理や漏水等にも話が広がり、有意義な勉強会となった。なお、座長代理として斎藤十朗・参議院議員が選任された。

「ふれっしゅ水道計画」は、高度浄水処理や漏水防止等の対策として、平成四年度から五年計画で、海淡水化による四方及び八日川の二つの建設を予定している。石川局長の説明後、出席メンバーから質問が出た。だが、各都府県海水淡水化の状況、特に高度浄水処理については、海淡水化の導入が、高度浄水処理の導入に比べて遅れているという。また、漏水防止の対策についても、高度浄水処理の導入が、漏水防止の対策に比べて遅れているという。また、漏水防止の対策についても、高度浄水処理の導入が、漏水防止の対策に比べて遅れているという。

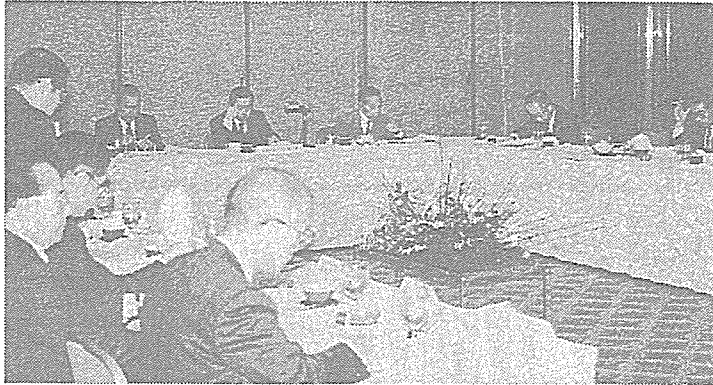

16日開かれた第6回水道問題研究会

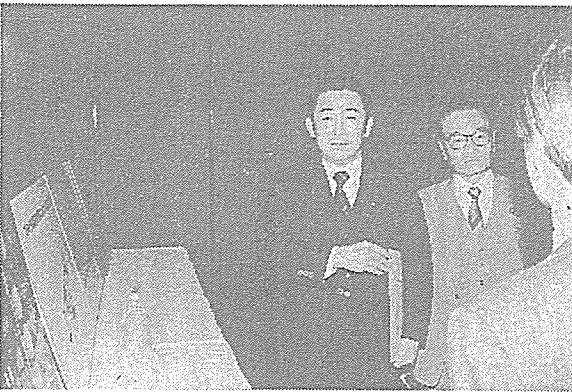

海淡の説明パネル前で厚生省の説明を聞く橋本座長と小澤氏

橋本座長は海淡水化について、概要を説明したが、同部長は「問題の多い海淡水化を求め、引き続き石川局長に海淡水化の説明が行われたが、これは沖縄県が平成四年度から水道事業で初めての海水淡水化導入を予定しているため、同県では絶対的な降雨量不足を背景に海水が恒常化しており、今後の水資源開発

体連(会)会(富岡)が水資源問題の多い海淡水化を求め、引き続き石川局長に海淡水化の説明が行われたが、これは沖縄県が平成四年度から水道事業で初めての海水淡水化導入を予定しているため、同県では絶対的な降雨量不足を背景に海水が恒常化しており、今後の水資源開発

体連(会)会(富岡)が水資源問題の多い海淡水化を求め、引き続き石川局長に海淡水化の説明が行われたが、これは沖縄県が平成四年度から水道事業で初めての海水淡水化導入を予定しているため、同県では絶対的な降雨量不足を背景に海水が恒常化しており、今後の水資源開発

れた上で、厚生省の藤原水道整備課長、大阪市の藤原水道事業管理者らが説明、水道事業の取り組み姿勢を述べ、研究会は施設整備推進のための生活環境課議員連盟と異色の「勉強会」のための集まりという特徴もあつて、質問も数回、内容も濃かった。

なお、この日の研究会で、座長代理に斎藤十朗・参議院議員を選出した。これは海淡水化への取り組みの状況、海淡水化の水資源問題に関連して漏水防止への関心も生じた。この二名の座長代理となる。

海水淡水化施設、10月に着工

96年度に完成 1日4万トンを取水


県企業局

総額二百億円をかけ海水淡水化施設の導入を急いでいる県企業局は、ことし九月までに実施調査設計を終え、十月から建設工事に着手することになった。九六年度内には完了する予定。完成すると現在の一日の需要量約四十万トのうち四万トンを海水淡水化で充てることになる。石川秀雄企業局長は「ダム、河川、地下水に加え、多角的な水源開発の一環として海水を利用

し、水道水の安定供給の充実に資したい」とその必要性を強調している。計画によると設置場所は北谷浄水場内。用地は約二万平方メートル。規模は一日生産量四万トンを、これは十万人の海水を取水し、このうち四万トンを水として利用、六万トンは濃縮海水となり海に放流する。淡水化方式は逆浸透法。


導入計画は、九〇年度から二年かけて水温、海性生物、水質、塩分、サンゴ、プランクトンなど環境影響調査を実施してきた。これに基づき九二年度から実施設計に入った。処理システムや構造物などに関する設計が検討され、九三年九月までには設計を終える予定である。

建設工事はことし十月に着工し九六年度内（九七年一月）には完成させたい考え。供用開始は工事の進み具合をみながら九五年度から、まず二万トン供用し、翌九六年度には計二万五千トン供用する計画。九七年度には四万トンすべて完了する。淡水化のシステムは海水を取水施設に入れ、調整設備、高圧ポンプ、逆浸透膜設備を通して淡水水槽に入るシステム。逆浸透膜で濃縮された海水は放流施設から海に戻される。十万人の海水のうち四割は水に、六割は海水に戻る。沖縄は復帰以来、二十年

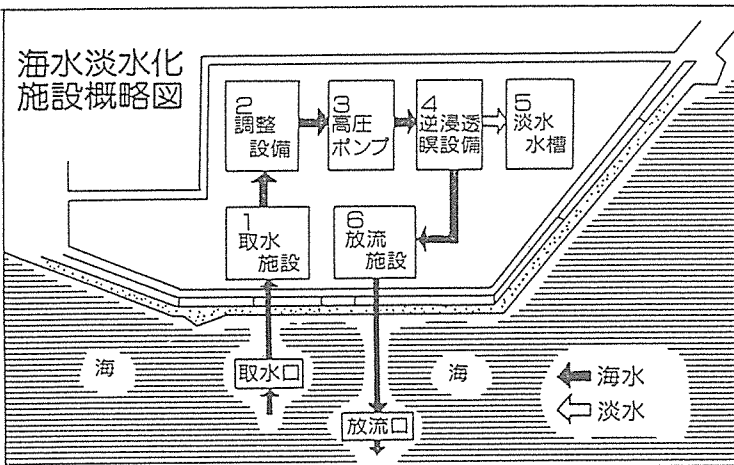

海水淡水化施設概略図

間のうち十三年において断水に伴う制限給水をした。その延べ日数は千九十九日にも及んでいる。九一年度は六十四日間も制限給水している。そのため多角的な水源開発が求められていた。

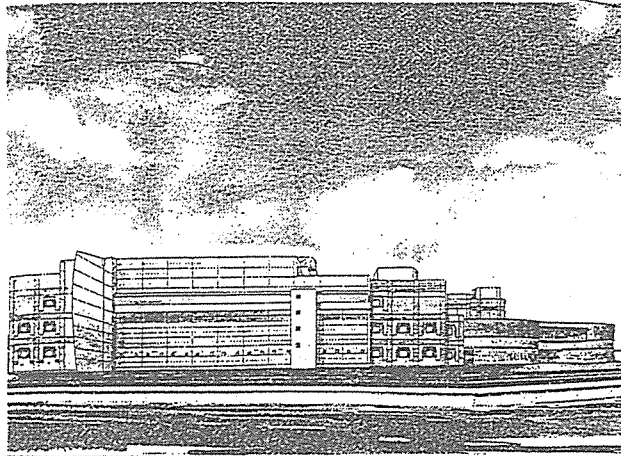

北谷町の淡水化施設完成予想図

今月中にも着工

北谷町に 淡水化施設 4万立方メートルの供給可能

県企業局(新垣勝市局長)は、九月三十日、県庁企業局第一会議室で北谷町の北谷浄水場内に設ける真海水淡水化施設土木建築工事の入札を行い、国場組を頭とする県内企業八社十二共同企業体に落札した。今月中も着工する予定。本年度から平成八年度までの四カ年がかりで二百億円を投じ、海水淡水化施設が建設される。

県企業局(新垣勝市局長)は、本年度の請負金額は四十九億五千四百三十万円。この施設が完成すると、沖縄市の市民十万人分が一日に使用している水の量に匹敵する四万立方メートルの生産供給が可能になる。

本県では復帰以来二十年間のうち十三年も断水を伴う制限給水を実施。延べ日数は千九百九日に及んでい。こうした厳しい状況を打開するため、企業局は多角的な水源開発の一環として一日当たり四万立方メートルが生産できる海水淡水化施設を建設し、県民に水道水の安定供給を図る。

平成五年度から工事に着手し、土木・建築工事、平成六年度は前年度に引き続き土木建築工事と機械、電気設備工事、同七年度から八年度にかけては機械、電気設備工事を行い、すべての設備を完成させる。淡水の生産については、同七年度から施設の一部を稼働させ、日量一万立方メートルの淡水を生産し、同八年度で二万五千立方メートル、同九年度で四万立方メートルを生産、供給する計画。

海水淡水化の方式は蒸発法、結晶法、逆浸透法、溶媒抽出法、イオン交換樹脂法の五方式に分類できるが、北谷浄水場の場合は、水は通すが塩水は通しにくい性質を有する半透膜を用いて淡水を得る逆浸透法を採り入れている。

一万二千平方メートルの敷地に、機械・電気施設および管理棟(地下一階、地上四階建て)、鉄筋コンクリート造り、建築面積八千九百平方メートル、延べ床面積一万七千六百平方メートル、海水取水設備、調整設備、逆浸透設備、淡水水槽、放流設備を設ける。

逆浸透法による海水淡水化施設としては世界五位になる。県内ではトップ。県内では他の方式も含め南北大東島、渡名喜島など七カ所に設置されている。


海水から真水を

今月 北谷浄水場に施設
着工

県企業局は三十日、北谷浄水場内に計画している国内最大の処理能力を持つ海水淡水化施設の第一期建設工事を、関係組を中心とする県内十二企業で構成する共同企業体に発注した。十月に着工し、造水施設が設けられる建物を建設する。来年度にはポンプ機械・電気施設などを整備。一九九

五年度に、日量二万トンの造水を開始する予定。同施設は今後、増大が予想される水需要をまかなうために建設。九七年度には全施設が完成し、逆浸透法と呼ばれる方法を用いて、日量四万トンを海水から真水に変える。総事業費は二百億円余。

二〇〇二年度には、県内

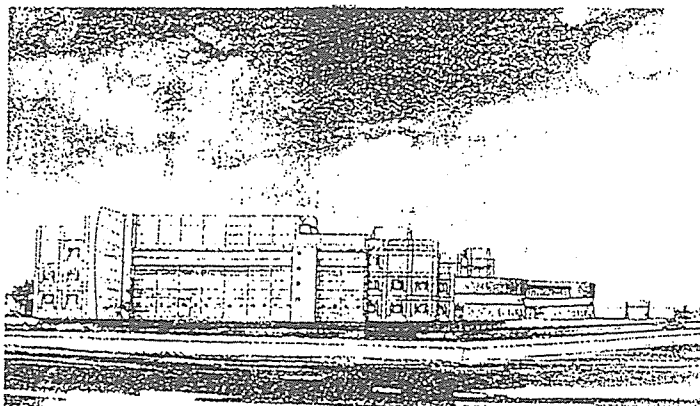

完成時には国内最大、世界でも５番目の造水能力を持つ県企業局の海水淡水化施設（完成予想図）

世界に誇れる「淡水化施設」を

国管理、県管理ダムはかなり整備されたが、本島の水事情は年間を通じてまた安心できない。少雨傾向が続くと、恒例のように県の湧水対策本部が節水呼び掛けを行い、制限給水の措置が講じられる。

大部分ダムからの補給と河川表流水など、河川水に依存しているから、降水量に期待をかけたダムの貯水風を気にして一喜一憂している状態である。

北谷町の北谷浄水場内に設けられるもので、県企業局が三十日、県内企業で構成する共同企業体に第二期工事を発注した。

二年後に日量二万トンの造水ができる。北谷の施設も世界に誇れるものになり、

そのようななかで将来、二日当たり四万トンを海水から真水に代えるという国内最大の「海水淡水化施設」工事が始まることになっている。

北谷町の北谷浄水場内に設けられるもので、県企業局が三十日、県内企業で構成する共同企業体に第二期工事を発注した。

二年後に日量二万トンの造水ができる。北谷の施設も世界に誇れるものになり、

北谷の施設も世界に誇れるものになり、

百億円余の全施設が完成する。

県内には北大東、南大東、粟國、渡名喜、石垣、波照間などに海水淡水化施設がある。いずれも「離島用」で一日当たり造水能力が数トンから数百トンといった小規模のものだ。四万トン造水施設は、これから水消費量は年々増大すると予想されるだけに、水不足緩和に大きく貢献するものと期待したい。

海水淡水化の方式にはいろいろあるが、本県で採用されているのは「逆浸透法」である。

水は通すが塩分は通さない半透膜で容器を仕切り、その片側に海水を入れ海水に圧力を加えることにより、透過させる方法だという。他の方式より電気消費量が少なくて済み、省エネでいわれている。

世界の海水淡水化施設は日量約千六百万トン。その五五％は中東地域が占めている。その多くは蒸気を利用せず、冷却して淡水をえる蒸発法。

これら施設の三分の一は日本が設置したものだという。この面の技術開発は世界のトップレベルといつていいであり、北谷の施設も世界に誇れるものになり、

海水淡水化施設に着工

沖縄県「北谷」で日量4万m³ 企業局

水源に乏しく、頻繁に濁水に見舞われている沖縄県で、企業局が多角的な水源確保の一環として計画していた海水淡水化施設が、先月いよいよ着工した。規模は全体で一日四万立方メートル。今回着工したのは、うち一日一万立方メートル分の土木建築。沖縄県企業局が着工した海水淡水化施設は、わが国では初のスケールアップした海水淡水化として注目されており、水に乏しい沖縄県では待望される施設・着工により、平成七年度にも淡水生産を開始できる見通しとなった。



新垣管理者

近年、人口の増加、観光客の増加、生活水準の向上、経済の発展が著しく、ますます水需要が増大している沖縄県では、水源河川の流域面積が小さく延長も短いことに加え、降雨の季節的変動が大きいため、安定した取水が極めて困難になっている。早急な水源確保の必要に迫られた沖縄県企業局では、逆浸透法による海水淡水化施設建設の事業計画では今年度は土木・建築工事を、六年度は土木

・建築工事と機械・電気設備工事を実施し、七年度には一部完成、日量二万立方メートルの淡水を生産。八年度には二万五千立方メートル、九年度には全施設が完成して四万立方メートルの淡水を生産・供給する運びとなっている。総事業費は二百億円。施設は、取水や配水の設備、逆浸透設備やろ過などの調整設備、電気施設・管理棟などの三ブロックに分かれており、建築面積八千九百平方メートル、延床面積一万七千六百平方メートルとなっている。

逆浸透法は、水は通すが塩水は通しにくい性質を有する半透膜を用いて淡水を得る方法で、近年淡水化の省エネルギー化に最も適した方法として急速に進んできており、蒸発法、電気透析法とともに実用プラントとしての稼働実績もある。海水淡水化施設は離島の簡易水道水源として、全国で十九カ所（平成二年度末現在）設置されており、沖縄県内でも、南・北大東島や波照間島などの離島で造水能力二百四十一立方メートル／日の施設があるが、北谷浄水場の海水淡水化施設が完成すると、国内最大、世界第五番目の造水能力となる。

沖縄県の「水問題」解決へ大きな期待!!

わが国初の大型規模海水淡水化計画

平成八年完成予定


総事業費
200億円

沖縄県の海水淡水化施設建設計画の竣工式が、去る十七日に行われた。建設場所は北谷町の北谷浄水場内であり、総事業費は約二百億円を見込み、平成八年度までの四カ年で完成する予定となっており、供用開始は平成七年度を予定し、県内水事情解決へ大きな期待が寄せられている。

県内水事情解決へ大きく寄与


沖縄県は急速な水資源

保が必要とされているが、
「海水淡水化施設」の導入により計画最終年度の生産量は一日四万トンにのぼる予定で、離島県沖繩の抱える「水問題」の解決に大きく寄与するものと思われる。

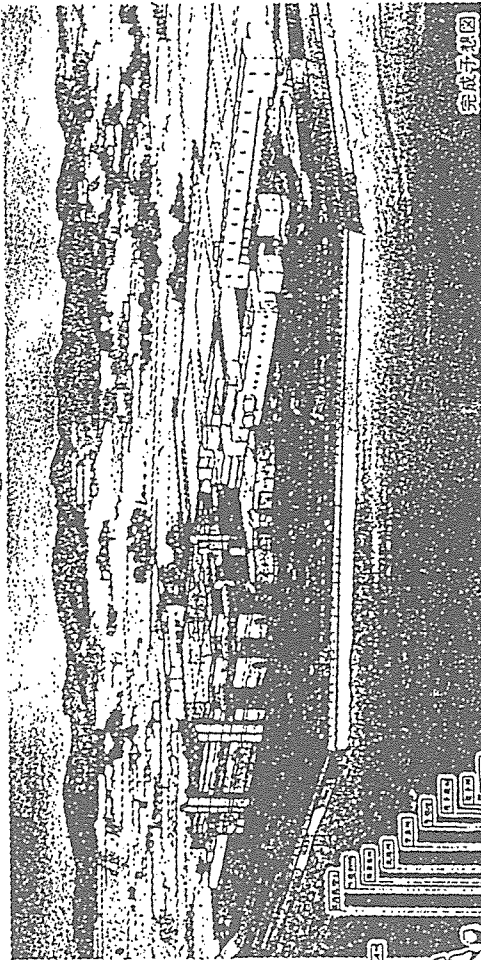


淡水化施設の利点

淡水化施設は、天候の影響に左右されることがなく、いつでも取水でき、建設用地も少なく済む。また、供給される水の質などにおいてもメリットがある。これまでも硬度の高かった中部地帯の水質が淡水化された生薬水とブレンドされ、軟水のよりのおいしい水が供給される。

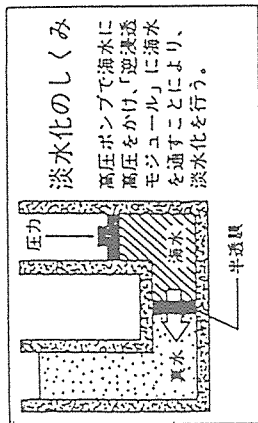

西系列水源開発など 積極的進行

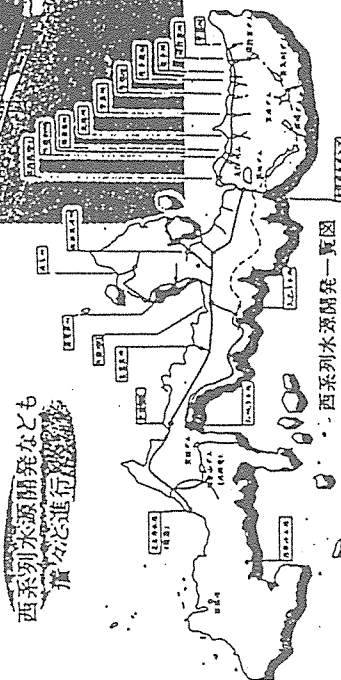

海水淡水化施設を起工

九年度完成時で日量4万ト供給

県企業局

【本紙記者高田洋一】県企業局は、今般（今年）に、八重瀬郡の八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。




海水淡水化施設起工式で、図入れをする尚副知事、新垣企業局長ら

県企業局長ら、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。

八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。この施設は、八重瀬川流域に、日給水4万トの海水淡水化施設（仮称）を起工する。この施設は、九年度完成時、日給水4万トを供給する。

来春に具体的検討



上原国土庁長官語る



国土庁長官上原が「国土政策を振興策を策定する」と語る。背景には「国土政策を振興策を策定する」とある。

海水淡水化に期待

上原国土庁長官は二十七日、那覇市内で記者会見し、四全総後も沖縄振興開発に力を注いでいくため国土庁、沖縄開発庁が検討を始めていることを明らかにした。

上原は「海水淡水化施設などが完成すれば好転していく」と語り、また、復帰四十周年事業が進んでいることを述べた。

上原は「海水淡水化施設などが完成すれば好転していく」と語り、また、復帰四十周年事業が進んでいることを述べた。

上原は「海水淡水化施設などが完成すれば好転していく」と語り、また、復帰四十周年事業が進んでいることを述べた。

上原は「海水淡水化施設などが完成すれば好転していく」と語り、また、復帰四十周年事業が進んでいることを述べた。

上原は「海水淡水化施設などが完成すれば好転していく」と語り、また、復帰四十周年事業が進んでいることを述べた。

海水の淡水化 本格導入へ

厚生省方針

慢性水不足地域を対象に

来年度から自治体補助

ダム建設より割安

維持費がカギ

厚生省は、慢性的な海水が湧いている地域に、大規模な海水淡水化施設を本格的に導入するための予算を来年度の概算要求に盛り込むことを決めた。この夏、全国的に深刻な海水に見舞われているが、九州、四国、中国地方などは、今年に限りすばらしい水不足に陥っている。海水淡水化施設は未だに左右されることはいくつか、ダムと比べて、用地取得を含めると建設費が割安で、工期も短く済む。昨年度から沖縄の日置四万トンの大規模施設を日本でも初めて建設しており、これを全国に広げたい考えだ。

淡水化施設は、真水だけを過す半透膜の両側に海水と真水を入れ、海水側に圧力を加えると、塩分だけが残って真水が反対側に移行する「逆浸透」の原理を使う。これを浄水した後、水道管に接続して、各家庭に水を供給する。

七十トンの施設が一九九〇年に完成、石垣島でも日置六万トンの施設が九二年に完成しているが、いずれも小規模なもの。日置地方トン規模のものは、沖縄本島の北谷町で建設中の施設が初めてだ。

家庭で使う水の量は一人一日当たり四回ほどで、平均して、慢性的な水不足が心配な自治体は補助する。三分の一を自治体で補助する。

数万トン規模の淡水化施設を建設するには三億円前後の費用がかかるが、厚生省は、この二分の一から三分の一を自治体で補助する。問題は、淡水化施設は、ダムよりも割安という問題が大きい傾向がみられ、このように自治体に順次建設を

動力費となるため、地域のこみ施設建設のエネルギーなどを有効利用すれば、維持管理費用をかなり減らすことができるという。

八月十四日現在、全国の海水状況を見ると、時間給水の影響人口が最も多いのは福岡県の四十四万七千人。次いで香川県の七十四万七千人、岡山県の六十三万九千人など。自らの水源では水道水をまかなえず、

他に入っている自治体を優先的に選ぶ。来年度にいくらかは概算要求するほかはまだ発表していない。厚生省によると、一日一、当たりの水を供給するための建設費を比べると、淡水化施設は、ダムよりも割安という問題が大きい傾向がみられ、このように自治体に順次建設を

促したい考えだ。

一方、取水した海水の六割を海に戻すことになると、塩分濃度が高い海水になっているため、周囲の環境への影響についても調査をしたうえで建設に取り組みたいとしている。

海水淡水化施設を推進

厚生省、制度活用は県の北谷施設だけ

ごみ発電で低コスト化へ

厚生省は、国民生活に深刻な影響を及ぼす海水の抜本的な解決策として、大規模な海水淡水化施設の建設を積極的に推進する方針を決めた。ダムより安く短期間でできるといのが理由。海水が起きやすい地方都市を中心に建設を進める考えで、来年度の概算費求に三方所程度の施設建設費補助約百億円を公共工事重点化枠として盛り込む。

厚生省は一九九二年度に海水淡水化施設を建設する自治体に建設費の二分の一から三分の一を補助する制度を設けているが、これまで制度を活用したのは沖縄県企業局の北谷淡水化施設（九五年度完成予定）だけ。自治体に制度の積極的活用を促すとともに、割

高な運転コストを引き上げるため、自治体のごみ発電の電力を利甲するよう求めていく。

淡水化施設は、海水と淡水をゼロインのような半透明な仕切り、海水に圧力を加えると海水から真水だけが染み出す仕組み。海水の体積の約四割の真水が得られる。

厚生省は、ダムが計画から完成までに十年以上かかるうえ、工費も一千億円を越すものが増えているのに対し、淡水化施設は①工期が三年程度と極めて短い②ダムから都市に水を送る長距離の導水管工事費や浄水場建設費も不要などの理由から、ダムより安くしている。

ただ、淡水化施設は、維持運転費が一日一斗当たり約百二十円と、ダムの水を浄水場で処理する場合の約四十五円と比べ三倍近くになる。運転費の約六割が電気代のため、厚生省は自治体にごみ焼却発電施設を併設し、ここで得られる電力を使えば、運転費は五十円台で済み、ダムの場合と差がなくなるとしている。

沖縄・北谷施設は、一日の真水生産量が四万斗で約十六万人の県民に水を供給。建設費は約三百億円。真水一斗当たりの単価は約七十五円。一方、沖縄県で現在、建設中のダムの中には、単価が約三倍の約百五十万円に上るものもある。厚生省は指摘してい

国内初の大型

海淡水施設工事が本格化

企画特選

金城建設 沖縄県の水道施設は国の高規格補助を受け...

今年には全国各地で断水騒ぎが相次ぐなど深刻な水不足状況が続いています...

金城建設 沖縄県の水道施設は国の高規格補助を受け...

一方水の需要は、人口の増加、経済の発展、観光客の増加などによって年々増加しているために、沖縄県の水需給は逼迫しているのが実情です...

多角的な水源開発の一環として導入されたこの海淡水施設整備事業は、業現にいたるまでにはクリアしな...

金城建設 ええ、このことに関して厚生省では平成四年四月に水道法の施行令...



金城建設 海淡水化施設は逆浸透設備がメイン。原料が海水で、海水からいかにきれいな水を生産する...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...



金城建設 規模からするとわが国では一番ですが、世界では五番目。現在国内で水道用としての海淡水化施設は八都府道三八の施設が設置されているが...

金城建設 規模からするとわが国では一番ですが、世界では五番目。現在国内で水道用としての海淡水化施設は八都府道三八の施設が設置されているが...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...


金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

金城建設 海淡水化の主要メリットは四つあります。一つは無農薬による海水から過水の影響を受けず...

供用開始に寄せて

沖縄県企業局におかれましては、幾多の苦難を経て、待望の海水淡水化施設の通水を迎えられ、誠に厚慶の至りであり、ここに心よりお祝いの詞を申し上げます。沖縄の雨は、限られた季節に一気に海へ流れ出るうえに、年間一人当たりの降水量も全国平均の半分以下である」と聞いており、それだけ水道水の確保に大切な努力が払われてきました。それでも海水による水道の断水被害もたびたびであり、断水の期間がらみとも、日本で最も水供給が逼迫している県といつて

も過言でない状況にあります。こうした状況から、沖縄県企業局では、地の利を生かして、無尽蔵な海水資源を利用して、適量塩素の浄水処理により水道水を導くことを基調とされ、昭和五十三年度に基礎調査が完了されました。平成元年度からの予備調査、環境アセスメント調査、学識経験者等による技術的検討を経て、平成四年度から実施設計に着手し、三年に及ぶ建設期間の後、本年二月に通水、供用開始に至るまでに邁進されました。



省 厚生 水道環境部長 坂本 弘道

今後の「範」となる施設


及、調査検討を経て平成四年既に事業化されたものもあり、また、事業化に当たり、水道法施行令および沖縄県独自の特別措置法施行令の改正

な取り組みを行ってまいりました。水道水質としてのこのような大規模な海水淡水化施設は国内では例がなく、事業主体

また、この間に、様々な問題への取組みにも思ひされたら向っており、深く敬意を表します。厚生省としても、沖縄の海水淡水化施設の導入を契機として、海水淡水化施設を水道水源開発施設に位置付け、国庫補助の対象とし、その建設を支援してまいりました。

顧みすれば、誠に長く困難に満ちた道程であり、関係の皆様には、このたびの通水は感慨も一入のものがあるかと存じます。申すまでもなく、沖縄県企業局の努力の結晶として完成した海水淡水化施設は、わが国最初の大型総合水道用の施設であり、これから海水淡水化施設を導入しようとしている他の水道事業者の範となるものです。今後は、適切な効果的な維持管理に努められ、沖縄県民を犠牲的な増水から解放し、快適な生活環境を創出するものとなることを期待します。

徒来から水不足に悩む沖縄において水の安定供給は喫緊の課題であり、平成四年に策定された第三次沖縄振興開発計画でも、水源開発は最重要事項の一つであり、ダム、地下水等に海水淡水化を加えた多角的な水源開発を行うこととされています。ここに海水淡水化施設が併せて通水の運びとなり、新たな安定水源として今後大に活躍するものと期待しております。



沖縄開発庁 振興局長 瀧川 哲男

的確な導入を高く評価

沖縄県企業局において建設が進められていた海水淡水化施設の供用開始を心からお祝い申し上げます。

沖縄本島への海水淡水化施設導入は、昭和五十二年の沖縄本島海水淡水化計画調査にまさかの運び、十年以上に

を待つほか、第三次沖縄振興開発計画の主要プロジェクトとして位置づけ、建設費の大半を国庫補助するなど、様々な

の沖縄県では大変な労苦を重ねられたことと思いますが、先進技術を的確に採り入れ、沖縄の豊かな自然環境の保全には十分配慮して事業を進められたことが、施設の供用として継続したものと高く評価する次第です。なお、平成八年度末の全県供用に向けた施設の整備については、沖縄開発庁といたしましても引き続き大限の支援を行っていく所存です。

最後となりましたが、海水淡水化施設の整備に取り組んでこられた関係者各位の努力に改めて敬意を表します。ともに、沖縄県の今後ますますの発展を祈念致しまして、お祝いの言葉を申し上げます。

「海水淡水化施設」に関する調査報告書

1) 厚生省（6件）

番号	調査報告書名	作成年月
1	沖縄本島海水淡水化計画調査 (ゴミ焼却プラントによる海水淡水化調査) (第1次)	昭和54年3月
2	沖縄本島海水淡水化計画調査 総合取水計画調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査) (その1)	平成54年3月
3	沖縄本島海水淡水化計画調査 (ゴミ焼却プラントによる海水淡水化調査) (第2次)	平成55年3月
4	沖縄本島海水淡水化計画調査 (ゴミ焼却プラントによる海水淡水化調査) (第3次)	平成55年3月
5	沖縄本島海水淡水化計画調査 水コストの検討及び水道水確保の方策 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成55年3月
6	沖縄本島海水淡水化計画調査 施設計画 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成55年3月

2) 日本水道協会（8件、厚生省委託費による）

番号	調査報告書名	作成年月
1	沖縄本島海水淡水化計画調査 施設計画調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査) (その2)	昭和54年3月
2	沖縄本島海水淡水化計画調査 安定的水道システム調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成56年3月
3	沖縄本島海水淡水化計画調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成57年3月
4	沖縄本島海水淡水化計画調査 (参考資料) (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成57年3月
5	沖縄本島海水淡水化計画調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成58年3月
6	沖縄本島海水淡水化計画調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成59年3月
7	沖縄本島海水淡水化計画調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成60年3月
8	沖縄本島海水淡水化計画調査 (海水淡水化に伴う上水道トータルシステム調査)	平成61年3月

3) 造水促進センター（8件）

番号	調査報告書名	作成年月
1	沖縄本島海水淡水化計画調査 (第1次)	昭和53年3月
2	沖縄本島海水淡水化計画調査 (第2次)	平成54年3月
3	沖縄本島海水淡水化施設基本計画調査 (小規模海水淡水化計画調査)	平成56年3月
4	沖縄本島海水淡水化施設基本計画調査 (逆浸透法による海水淡水化計画調査)	平成56年3月
5	沖縄本島海水淡水化計画調査 (海水淡水化施設基本計画調査)	平成57年3月
6	沖縄本島海水淡水化計画調査	平成59年3月
7	沖縄本島海水淡水化計画調査	平成60年3月
8	沖縄本島海水淡水化計画調査	平成61年3月

4) 沖縄県企業局業務委託 (14 件)

番号	調 査 報 告 書 名	作 成 年 月
1	北谷浄水場海水淡水化施設導入に関する調査 調査書	平成元年 8 月
2	北谷浄水場海水淡水化施設整備導入に関する予備調査 (その 1) 業務委託 (施設整備計画) 調査報告書	平成 3 年 3 月
3	北谷浄水場海水淡水化施設整備導入に関する予備調査 (その 1) 業務委託 (環境影響調査) 調査報告書	平成 3 年 3 月
4	北谷浄水場海水淡水化施設整備導入に関する予備調査 (その 1) 業務委託 (環境影響調査) 調査報告書 資料編	平成 3 年 3 月
5	沖縄県海水淡水化施設基本計画 (北谷浄水場海水淡水化施設設備検討 に関する予備調査 その 2) 基本計画書	平成 4 年 3 月
6	沖縄県海水淡水化施設基本計画 (北谷浄水場海水淡水化施設設備検討 に関する予備調査 その 2) 参考資料	平成 4 年 3 月
7	沖縄県海水淡水化施設整備導入に関する予備調査 (その 2) 業務委託 (環境影響調査) 調査報告書	平成 4 年 3 月
8	沖縄県海水淡水化施設整備導入に関する予備調査 (その 2) 業務委託 (環境影響調査) 環境影響調査書	平成 4 年 3 月
9	沖縄県海水淡水化施設整備導入に関する予備調査 (その 2) 業務委託 (環境影響調査) 環境影響調査書 資料編	平成 4 年 3 月
1 0	沖縄県海水淡水化施設整備導入に関する予備調査 (その 2) 業務委託 (環境影響調査) 総合報告書	平成 4 年 3 月
1 1	沖縄県海水淡水化施設 環境影響調査書	平成 4 年 3 月
1 2	海水淡水化施設に関する文献調査及び稼働施設実態調査 報告書	平成 5 年 2 月
1 3	海水淡水化における汚泥脱水実験調査業務委託	平成 5 年 3 月
1 4	海水淡水化における汚泥の塩分対策実験調査業務委託	平成 6 年 3 月

5) その他参考資料

番号	調査報告書名	調査機関	作成年月
1	海水淡水化トータルシステムの評価 調査報告書	日本海水学会	昭和 51 年 3 月
2	海水淡水化トータルシステムの評価 調査報告書	日本海水学会	昭和 52 年 3 月
3	海水淡水化トータルシステムの研究 成果報告書	造水促進センタ-	昭和 52 年 10 月
4	省エネルギー型海水淡水化技術開発 調査報告書	造水促進センタ-	昭和 53 年 3 月
5	造水船（海水淡水化）実用化の事前調査報告書	造水促進センタ-	昭和 55 年 3 月
6	離島での逆浸透法海水淡水化デモンストラ ション事業 報告書	造水促進センタ-	昭和 56 年 3 月
7	海水淡水化用語集 (海水淡水化施設指針作成調査)	造水促進センタ-	昭和 58 年 3 月
8	太陽熱利用熱拡散型多重効用法による海水淡水 化技術開発報告書	造水促進センタ-	昭和 58 年 3 月
9	太陽熱利用熱拡散型多重効用法による海水淡水 化技術開発報告書	造水促進センタ-	昭和 59 年 3 月
10	雑用水利用調査報告書（沖縄県）	造水促進センタ-	昭和 60 年 3 月
11	太陽熱利用熱拡散型多重効用法による海水淡水 化技術開発報告書	造水促進センタ-	昭和 60 年 3 月
12	海水淡水化技術開発調査報告書 逆浸透法海水淡水化技術開発報告書	造水促進センタ-	昭和 61 年 3 月

番号	調査報告書名	調査機関	作成年月
13	海水淡水化技術開発調査報告書 逆浸透法海水淡水化技術開発報告書	造水促進センター	昭和62年3月
14	島しょ部等における水需給実態調査及び海水淡水化プラント導入指針作成 調査報告書	造水促進センター	昭和62年3月
15	島しょ部等における水需給実態調査及び海水淡水化プラント導入指針作成 調査報告書	造水促進センター	昭和63年3月
16	新産業社会基盤施設整備基本調査 (排水循環利用施設関係)	造水促進センター	平成2年3月
17	水再生利用先端技術地域適用性調査 (水再生利用施設のフィジビリティ・スタディ)	造水促進センター	平成2年3月
18	海水淡水化用語集 (海水淡水化施設指針作成調査)	造水促進センター	昭和58年3月
19	海水淡水化の調査(水生生物への影響)報告書	東京都水道局	平成元年12月
20	平成3年度 沖縄県海水淡水化施設基本設計検討書	造水促進センター	平成3年11月
21	膜処理技術に関する文献調査 調査報告書	日本水道協会	平成4年3月
22	平成3年度厚生省委託費による海水淡水化施設導入並びに維持管理に関する調査報告書	日本水道協会	平成4年3月
23	海水淡水化施設海外視察 調査報告書	造水促進センター 視察調査団	平成4年11月
24	海水淡水化施設国内視察調査 報告書	沖縄県企業局	平成5年4月

第3章 計画から運転開始まで

1. 年表（経過記録）

海水淡水化施設導入は、平成元年度に行われた「北谷浄水場海水淡水化施設導入に関する調査」以来、本格的に企業局内で検討され、今日に至っている。

ここでは、この平成元年度の調査以来、関係機関との間で行われた調整や局内での打合せ、会議の経過を平成2～8年度まで整理し、経過記録としてまとめるものとする。

2. 推進連絡会議の設置

特に、建設工事の執行については、平成4年12月の実施設計発注後、様々な検討や調査設計がなされ、短期間で事業が進んでいくことになる。そこで、企業局では、(1)国内において最初の大規模海水淡水化施設であること、(2)平成4年度から平成8年度までの5ヶ年間にわたる大事業であること、(3)陸上から海域にまたがる広範囲の工事であること等の理由により、多岐にわたる関連業務を迅速に処理し、執行体制の強化、効率化を図るため局内に「沖縄県海水淡水化施設建設事業推進連絡会議」を設置した。

当該事業について、この会議を中心に事業が進捗していくことになる。

[推進連絡会議設置要領]

<p style="text-align: center;">沖縄県海水淡水化施設建設 事業推進連絡会議設置要領</p> <p style="text-align: center;">平成5年2月</p> <p style="text-align: center;">沖縄県企業局</p>	<p style="text-align: center;">沖縄県海水淡水化施設建設事業推進連絡会議設置要領</p> <p>1. 設置目的 企業局の行う海水淡水化施設建設事業の執行体制の強化を図るとともに、効率的な業務処理を行うために沖縄県海水淡水化施設事業推進連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。</p> <p>2. 構成及び業務の分担 連絡会議は、以下の課所で構成し、業務の分担は以下のとおりとする。ただし、新たな問題等が生じた場合は、その都度協議し、分担を定めるものとする。</p> <p>(1) 工務課 ①実施設計に関すること。 ②工事全般に関すること。 ③業務の全体総括に関すること。</p> <p>(2) 建設計画課 ①本省・本庁との調整に関すること。 ②環境アセスメントに関すること。</p> <p>(3) 南部浄水管理所 ①北谷浄水場に関連する業務の調整に関すること。</p> <p>(4) 水質管理所 ①水質試験及び水処理に関すること。</p> <p>(5) 用地課 ①用地及び補償に関すること。</p> <p>(6) 総務課 ①予算及び行事に関すること</p> <p>(7) 連絡会議を構成する課所以外に、関連する実務が生じた場合は、他の課室所から協力を得るものとする。</p>
--	--

年 月 日	経 過 記 録
平成 3 年度	
H 3. 4. 1 0	海水淡水化導入に係る環境調査発注。
6. 2 1	造水促進センター主催の海水淡水化技術研修会。
7. 3	海水淡水化施設の基本設計をコンサルタントへ発注。
7. 1 7	海水淡水化施設導入計画に関わる環境調査の説明を北谷町及び北谷漁業協同組合へ行う。
7. 1 8	造水促進センター主催の海水淡水化技術研修会。 (第 2 回、県庁会議室 12 F)
7. 2 3	「海水淡水化導入検討幹事会」開催。環境班 (第 3 回、県庁会議室 12 F)
7. 2 4	平成 4 年度国庫予算要求に海水淡水化施設整備費を水源開発施設として沖縄開発庁へ要請。
7. 2 4	「海水淡水化導入検討幹事会」開催。設備班 (第 3 回、県庁会議室 12 F)
7. 3 1	「海水淡水化導入検討委員会」開催。 (第 3 回、東京都道府県会館)
8. 2 2	厚生省は平成 4 年度から海水淡水化施設を水源開発施設の補助対象化にすることを決定。
1 0. 2	造水促進センター主催の海水淡水化技術研修会。 (第 3 回、県庁会議室 12 F)
1 1. 5	「海水淡水化導入検討幹事会」開催。環境班 (第 4 回、県庁会議室 12 F)
1 1. 7	造水促進センター主催の海水淡水化技術研修会。 (第 4 回、県庁会議室 12 F)
1 2. 1 6	国会議員で構成される「水道問題研究会 (第 6 回)」へ海水淡水化施設計画について局長が説明。(東京)
1 2. 2 2	平成 4 年度国庫予算大蔵内示において海水淡水化施設整備費が認められる。
H 4. 1. 3 1	日本水道協会が設置の「海水淡水化施設導入並びに維持管理に関する調査委員会」第 1 回。
2. 1 3	「海水淡水化導入検討幹事会」開催。環境班 (第 5 回、県庁会議室 12 F)
2. 1 8	「海水淡水化導入検討幹事会」開催。設備班 (第 4 回、県庁会議室 12 F)
3. 1 0	「海水淡水化導入検討委員会」開催。 (第 4 回、ハーバービューホテル)

年 月 日	経 過 記 録
平成 4 年度	
H 4. 4. 3	水道法施行令改訂で海水淡水化施設が水源開発施設として制度化される。
4. 2 0	県技監に対して、海水淡水化施設計画を説明。
4. 2 7	日本水道協会で「海水淡水化施設導入並びに維持管理に関する調査委員会」第 2 回開催。（東京）
5. 2 0	平成 5 年度国庫要請で海水淡水化施設整備の工事費を沖縄開発庁へ要請。
5. 2 0	日本水道協会が設置の「水道維持管理指針改訂特別調査委員会及び小委員会」第 1 回開催。
6. 1 9	海水淡水化施設整備計画を北谷町及び北谷漁業協同組合へ説明。（第 2 回）
7. 4	造水促進センターが「海水淡水化プラント導入調査委員会」設置。
1 2. 2	沖縄県海水淡水化施設実施設計業務委託現場説明。
1 2. 1 1	沖縄県海水淡水化施設実施設計業務委託入札。
H 5. 1. 2 6	北谷町へ海淡施設建設事業に係わる照会文書を提出し、協力を依頼する。
2. 1 6	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 1 回）
2. 1 7	ボーリング調査について、県知事あて海岸保全区域の占用申請を行う。
2. 1 7	磁気探査について、海上保安庁から許可を得る。
3. 1 2	北谷町漁港内にて、海淡施設に係る材料の耐蝕性試験を行うことについて漁協組合長から同意を得る。
3. 1 6	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 2 回）

年 月 日	経 過 記 録
平成 5 年度	
H 5 . 4 . 2 0	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 3 回）
4 . 2 2	厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課への説明。 （排水処理施設の必要性について）
5 . 1 0	海水淡水化施設における排水処理施設の施設整備する旨の決裁。
5 . 1 8	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 4 回）
5 . 2 6 2 8	海水淡水化施設調査 海水淡水化茅ヶ崎臨海研究施設、四国電力(株)伊方原子力建設所
6 . 2 9	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 5 回）
7 . 1 3	県河川課との占用打合せ。 取水・放流設備の工事概要説明及び占用手続きについて。
7 . 1 3	漁政課との岩礁破砕申請の打合せ。
7 . 1 5	海水淡水化施設実施設計における北谷町との打合せ。 取水・放流設備施工計画の説明。おおむね承諾を得る。
7 . 2 2	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 6 回） 北谷との打合せ（流入・流出管の施工計画）報告。
8 . 1 7	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 7 回） 海水淡水化施設の管理体制について。 北谷漁協及び地元説明会について。 北谷町から要求のある助成金等の取り組みについて。
8 . 2 3	北谷町漁業協同組合との工事説明会についての打合せ。 北谷町宮城区自治会との工事説明会についての打合せ。
9 . 8	海水淡水化施設建設工事発注方針及び指名に関する知事三役への説明。
9 . 1 2	北谷町宮城区地元説明会。（工事概要、施工計画）
9 . 2 4	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 8 回） 水の博物館等の建設の検討結果及び助成金等の交付の検討結果報告について。
9 . 2 4	建築物計画通知、建築工事届、計画建築物等の届出書提出。
9 . 3 0	沖縄県海水淡水化施設土木建築工事入札
1 0 . 1 9	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 9 回） 北谷町への照会に係る回答について。
1 0 . 2 0	普通財産貸付申請書の提出。（北谷町所有財産の使用許可について）
1 1 . 4	特例規定適用願申請（北谷町消防本部長宛）提出。
1 1 . 1 7	沖縄県海水淡水化施設建設工事起工式及び安全祈願祭。

年 月 日	経 過 記 録
H5. 12. 14	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第10回） 北谷町への照会に係る回答について。 工事中仮設道路について。 沖縄県海水淡水化施設建設事業作業分担について。 漁業補償調査経過報告について。
12. 27	海水淡水化施設建設に伴う北谷町への照会に関する北谷町との打合せ。 1. 関連施設事業について。 水の博物館の建設は考えていないが、各浄水場にビデオ・パンフ等を設置して見学者の便を図る。 2. 助成金等の交付について。 水源基金制度からの補助金交付については、ダム、取水堰等が対象であり、海水淡水化施設は対象外であるため、補助金等の交付は困難である。
H6. 1. 18	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第11回） 北谷町への照会に係る北谷町との協議について。 夜間電力受電に伴う沖縄電力(株)との協議について。 第1回北谷漁協との漁業補償交渉報告について。 工事進捗状況報告。
2. 2	県河川課との海岸保全区域占用許可申請。 利害関係者の承諾書、地元市町村の意見書、環境影響調査について。
2. 22	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第12回） 本省報告事項の説明。 第2、3回北谷漁協との漁業補償交渉報告について。 工事進捗状況報告。（杭打ち作業及びSMW工） 海水淡水化施設建設に係る許認可事項について。
2. 23	海水淡水化施設の調査団。 海水淡水化プラント導入の計画、維持管理等の諸問題点について。
3. 15	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第13回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 沖縄県海水淡水化施設土木建築工事その2工事概要。 北谷漁協との漁業補償交渉報告について。（総会報告） 建築仕上げ工事（タイルの色及びデザイン）について。

年 月 日	経 過 記 録
平成 6 年度	
H 6 . 4 . 1	沖縄県海水淡水化施設建設工事 1 6 mm フィルム撮影記録業務委託契約。
4 . 2 2	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 1 4 回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況報告。 沖縄県海水淡水化施設建設事業推進連絡会議設置要領確認。 海水淡水化施設建設事業月報。 漁業補償経過報告。 許認可事項経過報告。 その他。
4 . 2 7	海水淡水化に関する調整会議 イ. 逆浸透膜の仕様書作成について。（メーカーのカタログ評価及び性能比較について） ロ. ポリアミド複合膜・製造プロセスと関連特許について。
5 . 1 3	北谷漁協と漁業補償契約締結。
5 . 1 7	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 1 5 回） 海水淡水化施設建設事業月報。（工事進捗状況報告含む） 漁業補償経過報告。 平成 6 年度執行計画。
6 . 6	海岸保全区域占用許可申請書提出。（中部土木事務所）
6 . 7	岩礁破碎等の許可申請書提出。（農林水産部・漁政課）
6 . 2 1	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 1 6 回） 海水淡水化施設建設事業月報。（工事進捗状況報告含む）
7 . 8	海水淡水化における汚泥の塩分対策実験調査業務の報告会について。 1. 実験結果についての報告・説明。 2. 含塩分汚泥処理施設（希釈槽等）についての検討。 3. その他。
7 . 1 9	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 1 7 回） 海水淡水化施設建設事業月報。（工事進捗状況報告含む） 運転時（完成後）に関する監視体制について。（作業分担）
7 . 2 6	沖縄県海水淡水化施設建設総事業費について局長説明。
8 . 1 6	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 1 8 回） 海水淡水化施設建設事業月報。（工事進捗状況報告含む） 海水淡水化施設に関する今後の作業計画。
8 . 1 8	北谷町道路占用許可申請書提出。（建設課）
9 . 2 0	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 1 9 回） 海水淡水化施設建設事業月報。（工事進捗状況報告含む） 海水淡水化施設に関する使用薬品と使用量について。 海水淡水化施設に関する今後の作業計画について。

年月日	経過記録
H6.10.25	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第20回） 海水淡水化施設建設事業月報。（工事進捗状況報告含む） 海水淡水化施設の運転管理について。 平成6年度海水淡水化勉強会について。 海水淡水化施設使用薬品搬入について。
11.15	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第21回） 海水淡水化施設建設事業月報。（工事進捗状況報告含む） 海水淡水化施設の運転稼働率について。 海水淡水化施設稼働後3年間の水質監視について。（放流水・海域調査） 海水淡水化施設説明要員の確保について。
11.28	月刊建設界による座談会「海水淡水化施設整備事業の現状と施工技術」 建設計画課 課長
H7. 1.17	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第22回） 平成6年度事業状況について。 事業月報（平成6年12月号）について。 海水淡水化施設の説明要員について。 供用開始に伴う人員配置について。 PR用パンフ及び模型について。 その他。
2. 9	沖縄県海水淡水化施設放流設備工事に係る特定施設設置届出書提出。（北谷町長）
2.21	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第23回） 平成6年度事業状況について。 事業月報（平成7年1月号）について。 7年度海水淡水化施設ソフト面における予算要求について。 海水淡水化施設説明要員について。 海水淡水化施設名称について。 その他。
3. 5	水を考える小学生の集い、100名、海水淡水化施設を視察。
3. 7	北谷町所有普通財産の貸付期間更新申請書提出。（海水淡水化施設土木建築工事に伴う進入道路）（北谷町長）
3.22	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第24回） 平成6年度事業状況について。 事業月報（平成7年2月号）について。 サウジ・アラビア海水淡水化施設視察について。 海水淡水化施設視察用講堂映像上映施設及びソフトについて。 その他。
3.28	海水淡水化施設取水放流管布設工事工期延期に伴う岩礁破碎等の許可申請書の提出。（沖縄県農林水産部・漁政課）

年 月 日	経 過 記 録
平成 7 年度	
H 7. 4. 1 1	海水淡水化施設準備班との調整会議（第 1 回）
4. 1 8	海水淡水化施設準備班との調整会議（第 2 回）
4. 1 8	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 2 5 回） 平成 6 年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（4 月号）報告。（工事進捗状況含む） 平成 7 年度海水淡水化施設勉強会について。 平成 7 年度海水淡水化施設執行計画について。 その他。
4. 1 9	海水淡水化施設逆浸透設備工事に伴う特定施設設置届出書（空気圧縮機 1. 25 m ³ /分）の提出。（北谷町産業課）
5. 1	南部浄水管理所より、海水淡水化施設研修会の開催に伴う講師の派遣依頼。 1. 研修時期：平成 7 年 5 月下旬 2. 研修内容 1) 海水淡水化施設の方式、普及状況等について 2) 北谷浄水場海水淡水化施設概要、主要設備の諸元について
5. 9	海水淡水化施設準備班との調整会議（第 3 回）
5. 1 5	海水淡水化施設研修会の講師派遣について。（南部浄水管理所へ通知） 1) 海水淡水化施設の方式、普及状況等について 2) 北谷浄水場海水淡水化施設概要、主要設備の諸元について
5. 1 6	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 2 6 回） 平成 7 年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（4 月号）報告。（工事進捗状況含む） 海水淡水化施設休憩室設置について。 海水淡水化施設門扉設置について。
5. 1 6	海水淡水化施設準備班との調整会議（第 4 回）
5. 1 8	海水淡水化施設門扉設置工事に伴う北谷町、道路改良申請書（5 月 1 7 日付け）提出。（北谷町建設課）
5. 2 3	海水淡水化施設準備班との調整会議（第 5 回）
5. 2 6	北谷町宮城海岸における珊瑚産卵時期の工事に関する地元ダイバーとの打合せ。
5. 3 0	第 1 回海水淡水化施設研修会の開催。 研修会場：北谷町宮城公民館 参加者：企業技監、技術次長外、約 90 名
6. 1 3	海水淡水化施設準備班との調整会議（第 6 回）
6. 1 6	海水淡水化施設全体予算調整会議。 局長、技術次長 建設計画課：課長 工 務 課：課長、主幹、係長

年 月 日	経 過 記 録
H7. 6. 20	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第27回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（5月号）報告。（工事進捗状況含む） 海水淡水化施設名称について。 北谷浄水場構内入口改修工事について。
6. 20	海水淡水化施設準備班との調整会議（第7回）
6. 27	海水淡水化施設準備班との調整会議（第8回）
7. 4	海水淡水化施設準備班との調整会議（第9回）
7. 7	海水淡水化施設稼働時期に伴う工程打合せ。
7. 18	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第28回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（6月号）報告。（工事進捗状況含む） 海水淡水化施設稼働時期について。
8. 2	海水淡水化施設逆浸透設備工事に伴う下水排水に係る北谷町下水道課との調整会議。 北谷町下水道課、企業局工務課
8. 15	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第29回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（7月号）報告。（工事進捗状況含む） 海水淡水化施設稼働時期について。 振興四課、厚生省、通産省への出張報告。（総事業費、供用開始）
9. 5	海水淡水化施設準備班との調整会議（第10回）
9. 19	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第30回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（8月号）報告。（工事進捗状況含む）
10. 20	海水淡水化施設薬品（硫酸、水酸化ナトリウム）設置に伴う県薬務課及びコザ保健所の使用前検査。
10. 23	海水淡水化センター供用開始式第1回実行委員会
10. 31	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第31回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（9月号）報告。（工事進捗状況含む）
11. 20	海水淡水化センター供用開始式第2回実行委員会
11. 21	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第32回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（10月号）報告。（工事進捗状況含む）
11. 27	海水淡水化センター供用開始式第3回実行委員会

年 月 日	経 過 記 録
H7. 12. 15	海水淡水化センター供用開始式第4回実行委員会
12. 19	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第33回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（11月号）報告。（工事進捗状況含む） 海水淡水化施設総合試運転に係る工程計画説明。 海水淡水化施設模型制作について。
H8. 1. 16	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第34回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（12月号）報告。（工事進捗状況含む） 海水淡水化施設総合試運転に係る生産水送水量報告。 北谷町宮城海岸海底状況及び海生生物概況調査報告。
2. 5	沖縄県海水淡水化センター供用式典リハーサル。
2. 6	沖縄県海水淡水化センター供用式典。
2. 20	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第35回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（1月号）報告。（工事進捗状況含む） 沖縄県海水淡水化施設建設事業推進連絡会議の構成員の変更について。
3. 26	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第36回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（2月号）報告。（工事進捗状況含む） 海水淡水化総合試運転計画。 海水淡水化運転状況報告。
3. 28	普通財産貸付契約更新申請書の提出。（北谷町財政課）3.25日付け

年月日	経過記録
平成8年度	
H8. 4. 4	「海水淡水化施設の導入とエネルギー消費について」の研究報告会。 日 時：平成8年4月4日 場 所：本庁第4会議室 報告者：岐阜大工学部、松井助教授
4. 1 6	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第37回） 平成7年度国庫補助事業執行状況報告。 海水淡水化施設建設事業月報（3月号）。（工事進捗状況含む） 海水淡水化施設総合試運転計画。 海水淡水化施設運転状況報告。 その他。
4. 2 7	見学者に海淡水を試飲させるため、試験ユニットを稼働できる状態にする。
5. 2 1	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第38回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 平成8年度海淡工事執行状況及び計画。 その他。
6. 1	水道週間海淡施設一般公開 見学者 53名 対応者：海淡センター職員
6. 1 8	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第39回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 海水淡水化施設運転・保守管理研修計画。 その他。
7. 1 2	総合事務局公益事業課 又嶺徹 通産省公益事業課施設局長 外3名 海淡施設を視察。
7. 1 6	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第40回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 平成7年度工事試運転調整進捗状況。 その他。
7. 1 6	振興第四課専門官 外2名 海淡施設を視察。
7. 3 1	建設省河川局防災課災害第一課長 外2名 海淡施設を視察。
8. 8	北部ダム事務所（統管事務所）事務所長 外11名 海淡施設を視察。
8. 8	総合事務局通産部補佐 外4名 海淡施設を視察。
8. 1 5	海淡施設の運転を再開する。 生産水量：15,000 m ³ /日
8. 2 0	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第41回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 その他。

年 月 日	経 過 記 録
H 8. 9. 1 7	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 4 2 回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 その他。
1 0. 1 5	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 4 3 回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 海水淡水化施設運転状況報告。 海水淡水化施設運転管理小委員会報告。 海水淡水化施設環境影響調査報告。 その他。
1 1. 1 9	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 4 4 回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 海水淡水化施設運転状況報告。 海水淡水化施設運転管理小委員会報告。 その他。
1 2. 1 7	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 4 5 回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 海水淡水化施設運転状況報告。 海水淡水化施設運転管理小委員会報告。 その他。
H. 9 1. 2 1	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 4 6 回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 海水淡水化施設運転状況報告。 海水淡水化施設運転管理について。 その他。
2. 1 8	海水淡水化施設建設事業推進連絡会議（第 4 7 回） 海水淡水化施設建設工事進捗状況。 海水淡水化施設運転状況報告。 その他。

あとがき



「沖縄県海水淡水化施設建設誌」の発刊に寄せて、関係者各位に感謝の意を込めて御挨拶を申し上げます。多角的な水源開発の一環として、待望久しかった沖縄県海水淡水化センターは、県民並びに関係機関のご配慮と多くの工事関係者のご努力により、工事着工から約4年の歳月を経て平成9年3月に完成し、その雄姿を見ることができました。これは、県民の大きな喜びであり、関係者の皆様のご尽力に対し改めて心から感謝を申し上げる次第であります。

当センターは、海辺の空間と住環境に配慮し、自然の景観と近代技術とを見事に調和させ、新しい水源開発の象徴となっております。特に、技術の粋を集めた中央監視制御設備は施設全体の運用を適切にコントロールするための情報処理制御設備です。また、周辺環境との調和を図った管理棟は、北谷浄水場と並び企業局の主要な施設となっております。

企業局は、受水者への安定給水をめざして日夜努力いたしておりますが、当センターの完成を機に心を新たに、安定した用水供給事業を積極的に推進し、県民の命の水を守り、県民から信頼されるよう一層精進しているところでありますので、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

終わりに、本書が多くの方々に活用され、21世紀に向かう新しい水道技術の向上に寄与できれば幸いに思います。

平成 11 年 3 月

沖縄県企業局


技術次長 大城 盛吉

海水淡水化施設建設誌編集委員会名簿


氏名	所属	備考
大城 盛吉	技術次長	委員長
城間 一男	総務課課長補佐	委員
阿波根直清	経営計画課主幹兼計画係長	〃
仲宗根正雄	北谷浄水管理事務所海水淡水化センター長	〃
多和田真次	西原浄水管理事務所次長	〃
知名 定信	水道施設管理事務所主幹兼保全第3課長	〃
湾野 英雄	水道施設管理事務所主任技師	〃
赤嶺 永正	水質管理事務所主幹	〃
大城 康信	建設課課長補佐	〃
比嘉 義雄	建設課第1係長	事務局
長嶺 洋	建設課第1係主任技師	〃

沖縄県企業局組織図

職員定数：351人
(平成10年4月1日現在)

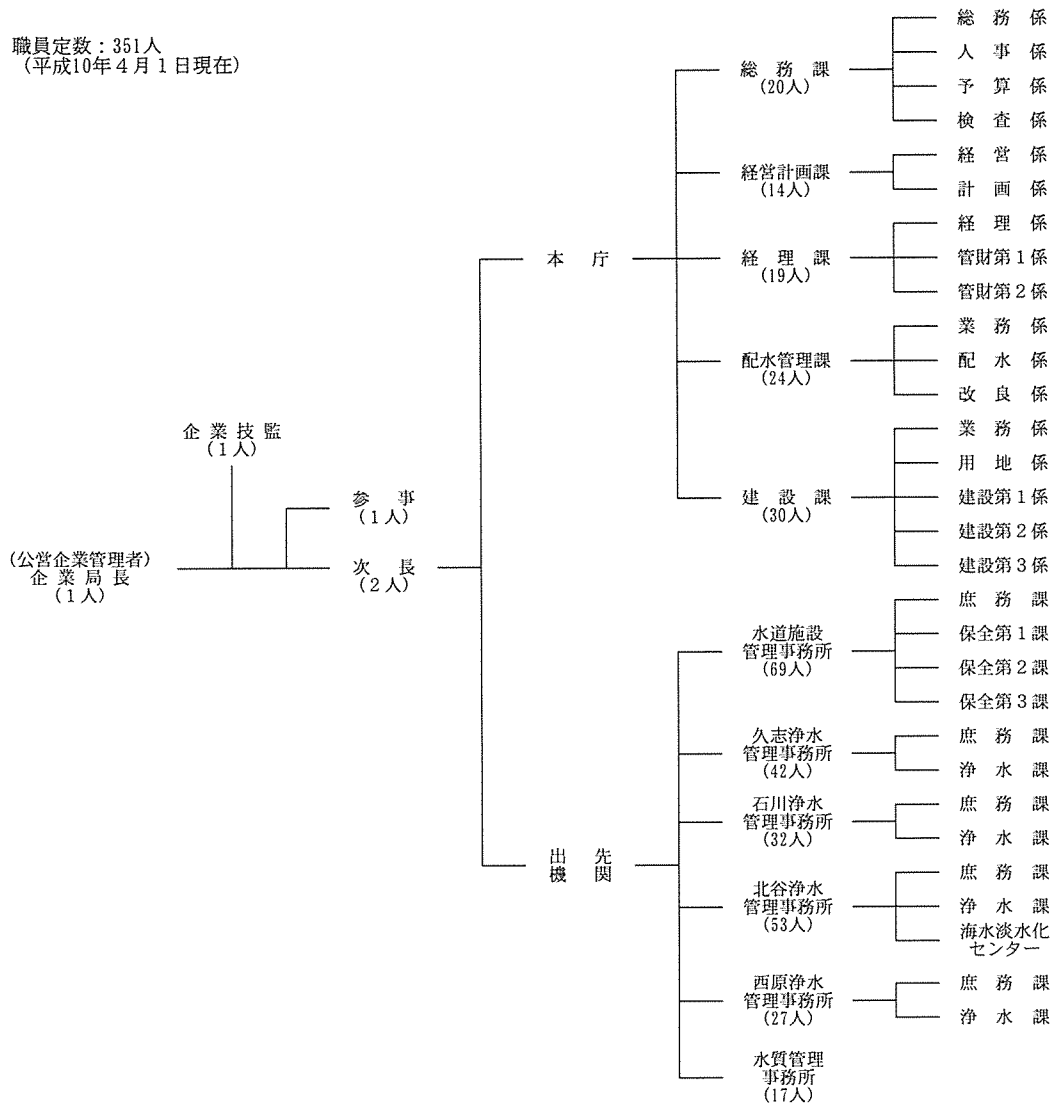

沖縄県海水淡水化センター 案内図

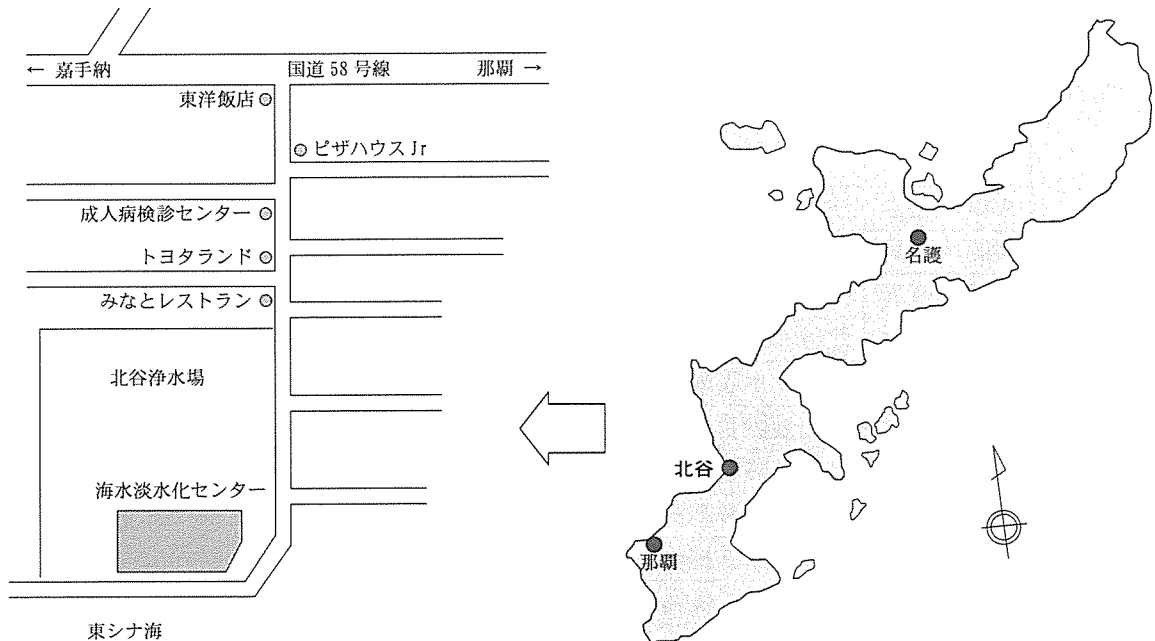

貴重な水を大切に！！



沖縄県海水淡水化施設建設誌

1999年（平成11年）3月発行

監修・発行／沖縄県企業局

〒900 那覇市泉崎1丁目2番2号

TEL (098) 866-2801

編集・製作／株式会社 日水コン
